


Collections Strategy Design

Lineamientos para la implementación de pilotos

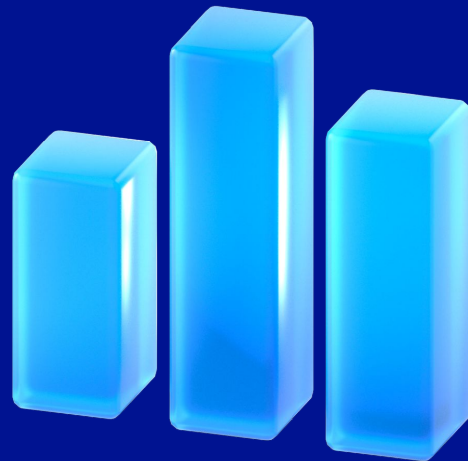

Journey Metodología Champion-Challenger

	<u>Diseño</u>	Propuesta a REC	<u>Implementación</u>	<u>Seguimiento</u>	Coronación	<u>Implementación BAU</u>
	- Ideación preliminar - Viabilidad técnica - Segmentación - Definición de Ch - Ch - KPI'S de medición	- Objetivo Ch- Ch - Beneficios - Aprobación	- Definición de fecha - Data/lógica Ch - Ch - Configuración - Validación	- Reporte - Monitoreo - Reuniones mensuales	- Análisis de resultados - Acta de aprobación	- Traspaso de lógica - Configuración - Despliegue - Monitoreo y acompañamiento
Responsable:	Diseño de Estrategias	Diseño de Estrategias	Diseño de Estrategias Data analytics	Gestión del desempeño de Estrategias	Diseño de Estrategias	Diseño de Estrategias Data analytics
Entregable:	<u>LLD</u> de Ch - Ch	Acta de REC	Correo de confirmación	Correo de resultados	Acta de REC	Correo de confirmación
Tiempo: (*Complejidad)	*Baja: 2 días *Media: 5 días *Alta: 7 días	1 día	*Baja: 2 días *Media: 5 días *Alta: 7 días	Periodo de vigencia del piloto	1 día	*Baja: 2 días *Media: 5 días *Alta: 7 días


Planificación mensual de trabajo

Diseño e implementación

Ceremonias

Pilotos vigentes

Nuevos pilotos

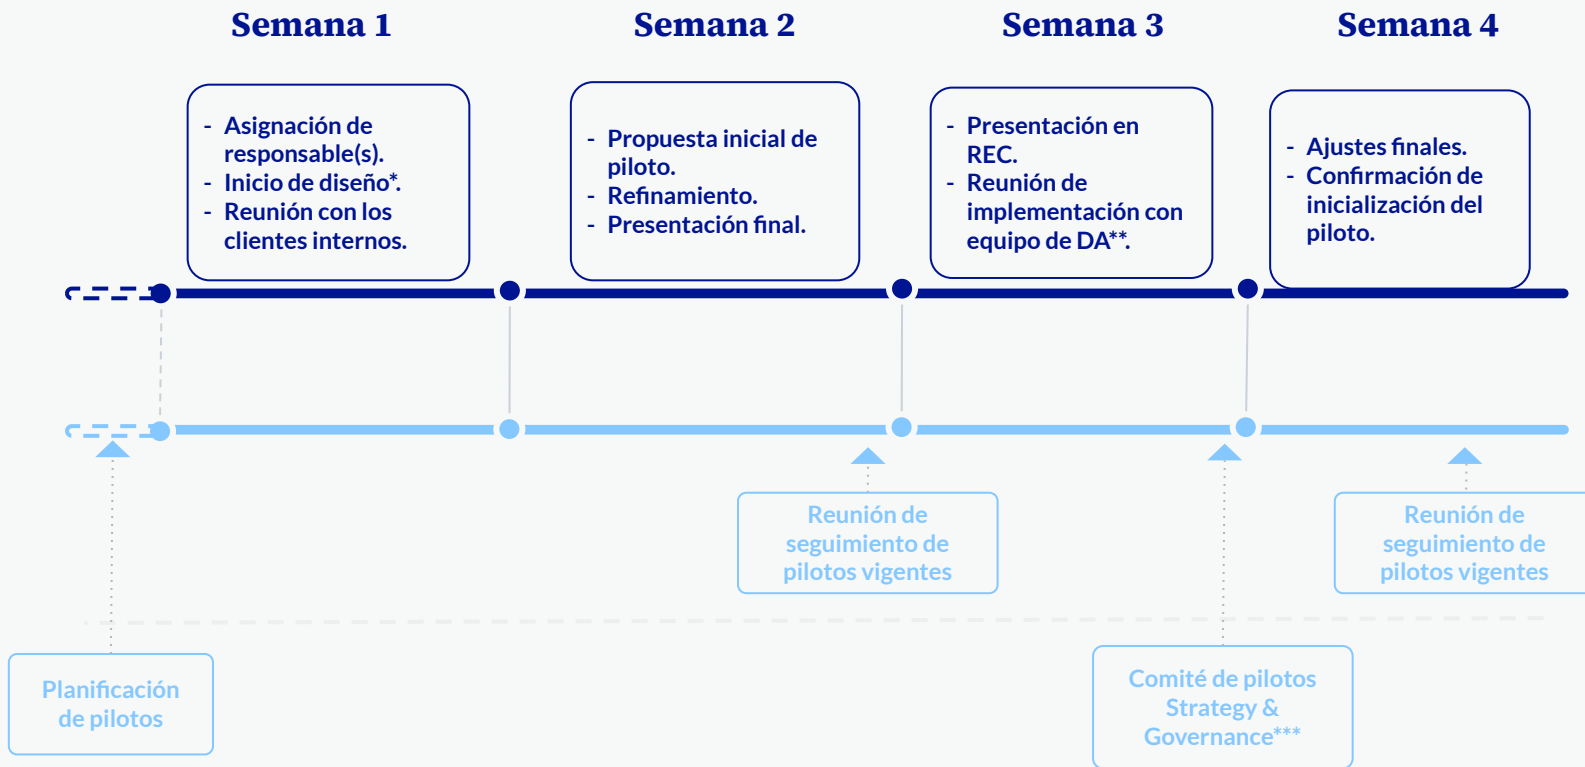

* Dependiendo de la complejidad, el diseño y propuesta final del piloto puede realizarse en 1 semana lo que permitiría considerar implementar otro piloto que no estuvo mapeado al cierre del mes anterior.

** La reunión debe darse máximo 7 días hábiles antes del cierre de mes.

*** Reunión para la implementación y seguimiento de pilotos a nivel de equipo de E&G. El resto de reuniones son de forma interna solo del equipo de Diseño de Estrategias.

Especificaciones LLD (Low -Level-Design)

Sección	Descripción
Resumen de challenger	Breve descripción de la Challenger y sus beneficios esperados.
Arquitectura de datos	Definición de tablas raw (origen) y estructura de salida (output) para que Data Analytics valide la recepción.
Lógica de segmentación	El query detallado o pseudocódigo que define quién entra al piloto y quién se queda en el grupo de control.
Variables control	Factores que deben permanecer iguales en ambos grupos para nos sesgar el resultado .
Matriz Challenger	Mapeo detallado de los tratamientos que debe contener los pilotos.
Validación técnica	Protocolos de validación: Simulación Previa: realizar una corrida en ambiente de prueba antes del cierre de mes para validar que la lógica asigne a los clientes correctamente. Criterios de Aceptación: verificación de que el piloto cumple con los parámetros definidos en el diseño.
Protocolo rollback	Acciones si el piloto genera un impacto negativo significativo en los resultados.

Lineamientos de Diseño

Lineamiento

1. Los pilotos a diseñar se definen al cierre del mes anterior. El tiempo del diseño dependerá de la complejidad.
2. Muestra y Exclusión: determinar la muestra objetivo, excluyendo casos atípicos
3. Homogeneidad: validar y garantizar que los grupos sean "espejo" (cantidad, contratos, ticket promedio, etc).
4. Definir el canal de gestión por el cual se desarrollará el piloto.
5. Métrica Decisora: definir el KPI principal que determinará el éxito del piloto (coronación).
6. Invariabilidad: prohibir cambios en otras variables de negocio (gestión diferenciada, campañas) que puedan sesgar el resultado.
7. Para la implementación del piloto se entregará un LLD al equipo de DA.

Responsable

Diseño de Estrategias

Lineamientos de Implementación de pilotos

Lineamiento

1. Debe remitirse la aprobación del piloto en REC para iniciar con la implementación.
2. Previa a la implementación del piloto se agendará una reunión de explicación y entendimiento. Como máximo esta reunión debe darse 8 días hábiles antes del cierre de mes para poder llegar con los tiempos.
3. El equipo de DA debe definir un responsable para las coordinaciones en la implementación.
4. Definir la estructura de datos a requerir así como su validación al momento de recepcionar la información.
5. De haber algún bloqueante se debe generar una reunión ad hoc para evaluar la salida del piloto o las acciones correctivas.
6. El 3er viernes de cada mes se celebra la sesión donde el equipo de Design Strategy detalla al resto del equipo (Data, Monitoring & QA) los pilotos y cambios que se desean realizar.
7. Definir la fecha en que se enviarán los inputs los mismos que deberán ser remitidos al responsable de DA antes del mediodía para poder aplicarse al día siguiente, caso contrario, se extenderá un día más.
8. Enviar correo confirmando que el piloto se implementó dentro de las fechas y criterios establecidos. De haber algún contratiempo se deberá informar para evaluar fechas.

Responsable

Diseño de Estrategias
QA

Diseño de Estrategias

Data Analytics

Data Analytics

Data Analytics

Diseño de Estrategias

Diseño de Estrategias

Data Analytics

Lineamientos de Seguimiento

Lineamiento

1. Cada piloto debe tener una reportería ad hoc (diaria) la misma que debe definirse en la etapa de diseño con los principales KPI'S que evaluarán los resultados.
2. Mínimo debe evaluarse de 2 a 3 veces por semana que los pilotos están cumpliendo con los parámetros definidos. De haber algún error, se evaluará llevar a REC una extensión del piloto.
3. De haber algún impacto negativo significativo en los resultados generales por la implementación del piloto se evaluará la cancelación del mismo.
4. Se generarán reuniones quincenales para revisar los resultados de los pilotos y decidir su coronación.

Responsable

Diseño de Estrategias

Lineamientos de Coronación

Lineamiento

1. Para definir que un piloto debe coronarse, mínimo debe evaluarse los resultados por 3 meses.
2. Los resultados deben llevarse a REC luego del vencimiento de la vigencia del piloto u 10 días antes de su vigencia para poder implementarlo al siguiente mes.

Responsable

Diseño de Estrategias

Diseño de Estrategias

Lineamientos de Implementación de estrategia BAU

Lineamiento

1. Debe remitirse el acta de REC con la coronación del piloto para iniciar con la implementación.
2. Se establecerá una sesión para formalizar el traspaso de la lógica (query, parametrización, etc). Dicha sesión deberá ejecutarse con un deadline mínimo de 8 días hábiles previo al cierre mensual para garantizar el cumplimiento del cronograma de despliegue.
3. Se realizará otra una sesión ad hoc para el traslado de la reportería. El responsable de DA podrá evaluar realizar modificaciones dado la diferencia de perfiles. En caso se genere un nuevo piloto en base a la reportería inicial esta se podrá mantener dentro del ámbito del equipo de Diseño.
4. Cualquier cambio en la reportería solicitada por el usuario se llevará al backlog respectivo para su priorización.
5. El equipo de DA debe definir el/los responsable(s) para las coordinaciones en el traspaso de los puntos 2 y 3.
6. De haber algún bloqueante se debe generar una reunión para evaluar la mejor alternativa e informar a los usuarios
7. Se debe realizar una simulación previa al cierre de mes para validar que las lógicas están correctamente implementadas (acompañamiento equipo Diseño).
8. Enviar correo confirmando que el piloto se implementó dentro de las fechas y criterios establecidos.

Responsable

Diseño de Estrategias
QA

Diseño de Estrategias

Diseño de Estrategias
Data Analytics

Data Analytics

Data Analytics

Data Analytics

Diseño de Estrategias
Data Analytics

Data Analytics

[VOLVER](#) <

Lineamientos adicionales

Lineamiento

1. Los pilotos no inician intrames, caso contrario, se trasladará al siguiente mes.
2. No se consideran pilotos aquellos tácticos que se soliciten en los últimos días del mes y no pasen por aprobación de REC. Para darle continuidad al táctico debe convertirse en piloto y ser llevado a REC.
3. La implementación de los tácticos será evaluado por los Senior Managers.
4. Se pueden generar excepciones a los lineamientos previa coordinación y aprobación del Principal Manager de Strategy & Governance

Responsable

Diseño de Estrategias


Diseño de Estrategias

Diseño de Estrategias
Data Analytics

Principal Manager Strategy &
Governance

Collections Strategy Design

Lineamientos para la implementación de pilotos

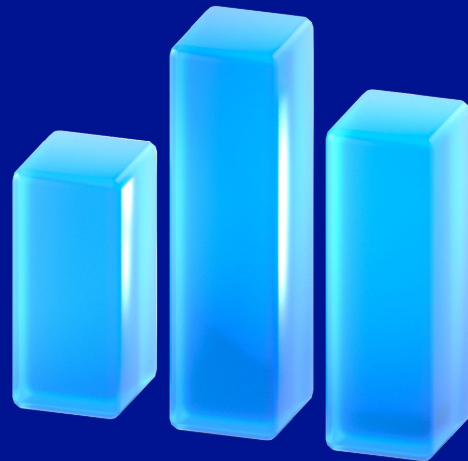

Contexto del Diseño (LLD)

Problema

- Falta de **definición técnica** granular para la ejecución de campañas Ch-Ch.
- Riesgo de **solapamiento** entre grupos piloto y control por falta de lógica determinística.
- Ausencia de un **protocolo de respuesta** ante fallos en la matriz de comunicación.

Objetivo

- Diseñar un **flujo técnico** que asegure la ingesta correcta desde fuentes origen.
- Garantizar que la **segmentación** sea auditable y libre de sesgos operativos.
- Definir una **matriz de canales** optimizada con control de frecuencia (capping).

Alcance

- Cartera de clientes seleccionada para el piloto **Ch-Ch**.
- Componentes de datos: **Arquitectura, Lógica y QA**.
- Plataformas de envío involucradas (pcc-optimus,sms).



Indicador Clave: Estabilidad en el Despliegue

Especificaciones LLD

Arquitectura de Datos

- Definición de **Tablas origen**.
- Esquema de la **Tabla Output** para motores de campaña.
- Mapeo de linaje y tipos de datos.

Lógica de Segmentación

- Lógica determinística para división de grupos.
- Distribucion aleatoria

```
SELECT * FROM universe  
WHERE HASH(user_id) % 10 < 8 --  
Piloto 80%
```

Variables

- Mantenimiento de **Constantes de Control**.
- Aislamiento de factores externos (Estacionalidad).
- Filtros de exclusión por riesgo



Indicador Clave: Estabilidad en el Despliegue

Arquitectura

- Definición de **Tablas origen**.
- Esquema de la **Tabla Output** para motores de campaña.
- Mapeo de linaje y tipos de datos.



Indicador Clave: Estabilidad en el Despliegue

Arquitectura

- Definición de **Tablas origen**.
- Esquema de la **Tabla Output** para motores de campaña.
- Mapeo de linaje y tipos de datos.

Segmentación

- Lógica determinística para división de grupos.
- Distribucion aleatoria

```
SELECT * FROM universe  
WHERE HASH(user_id) % 10 < 8 --  
Piloto 80%
```

Variables

- Mantenimiento de **Constantes de Control**.
- Aislamiento de factores externos (Estacionalidad).
- Filtros de exclusión por riesgo



Indicador Clave: Estabilidad en el Despliegue

Matriz Ch-Ch

- **Canal:** Definición de mix Push/SMS/Mail.
- **Horario:** Ventanas de envío optimizadas.
- **Frecuencia:** Reglas de presión comercial.

Plan de QA

- Casos de prueba para **asignación errónea**.
- Validación de **filtros de exclusión**.
- Testeo de triggers de comunicación.

Rollback

- **Switch de Apagado** inmediato.
- Reversión de lógica a estado estable anterior.
- Notificación técnica automática.



Indicador Clave: Estabilidad en el Despliegue
